

社会資本整備総合計画

中井町における循環のみちの実現

事後評価

な か い ま ち
中 井 町

平成29年 2月23日

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）事後評価書

平成29年 2月23日

計画の名称	中井町における循環のみちの実現									
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度（5年間）			交付対象	中井町					
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。									
計画の成果目標（定量的指標）	①下水道処理人口普及率を70.4%（H23）から75.2%（H27）に増加させる。									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考		
						当初現況値	中間目標値		最終目標値	
						(H23当初)	(H25末)	(H27末)		
①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人) / 総人口(人)						70.4%	72.3%	75.2%		
全体事業費	合計 (A+B+C)	380百万円	A	317百万円	B	0百万円	C	63百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	16.6%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
・中井町下水道運営審議会において実施	・事業終了後 公表の方法 ・町ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業											上段（計画）		下段（実施）					
A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
											H23	H24	H25	H26	H27			
酒匂川左岸処理区																		
A1-1-1	下水道	一般	中井町	直接	-	汚水	新設	第12処理分区枝線整備（未普及解消）	A=33.3ha (21.6haは設計委託対象面積) A=7.6ha	中井町						317		
																216		
											合計					317		
																216		

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
合計													0				
合計													0				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
C-1-1	下水道	一般	中井町	直接	-	新設	第12処理分区枝線整備(未普及解消)	A=5.7ha (0.8haは設計委託対象面積)	中井町							62	
							A=1.5ha										35
C-1-2	下水道	一般	中井町	直接	-	パンフレット	普及促進パンフレット作成	下水道パンフレットの作成	中井町							1	
							-										0
合計													63				
合計													35				
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		
C-1-1	基幹事業である污水管整備と接続する枝線整備を一体的に行うことにより、整備効率が上がり普及率の向上につながる。																
C-1-2	下水道パンフレットを作成し、町民配布することにより、下水道への理解を高め、接続率の向上を図る。																


2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		枝線整備により、生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図る目的を達成する整備ができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標① (下水道処理人口普及率)	最終目標値	75.2%	目標値と実績値に差が出た要因	実績の整備面積は、目標面積に達していないが、総人口(分母)が減少したため、相対的に普及率が目標値を上回ったもの。
		最終実績値	77.8%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項(今後の方針等)	
下水道処理人口普及率については、今後も下水道整備区域の拡大に努めなければならない。 また、下水道整備区域の整備に伴い、水洗化率向上のため啓発事業を行うとともに、戸別訪問等を実施し投資的効果を図る必要がある。	

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	中井町における循環のみちの実現		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	中井町

酒匂川流域下水道左岸処理区 第12処理分区計画図

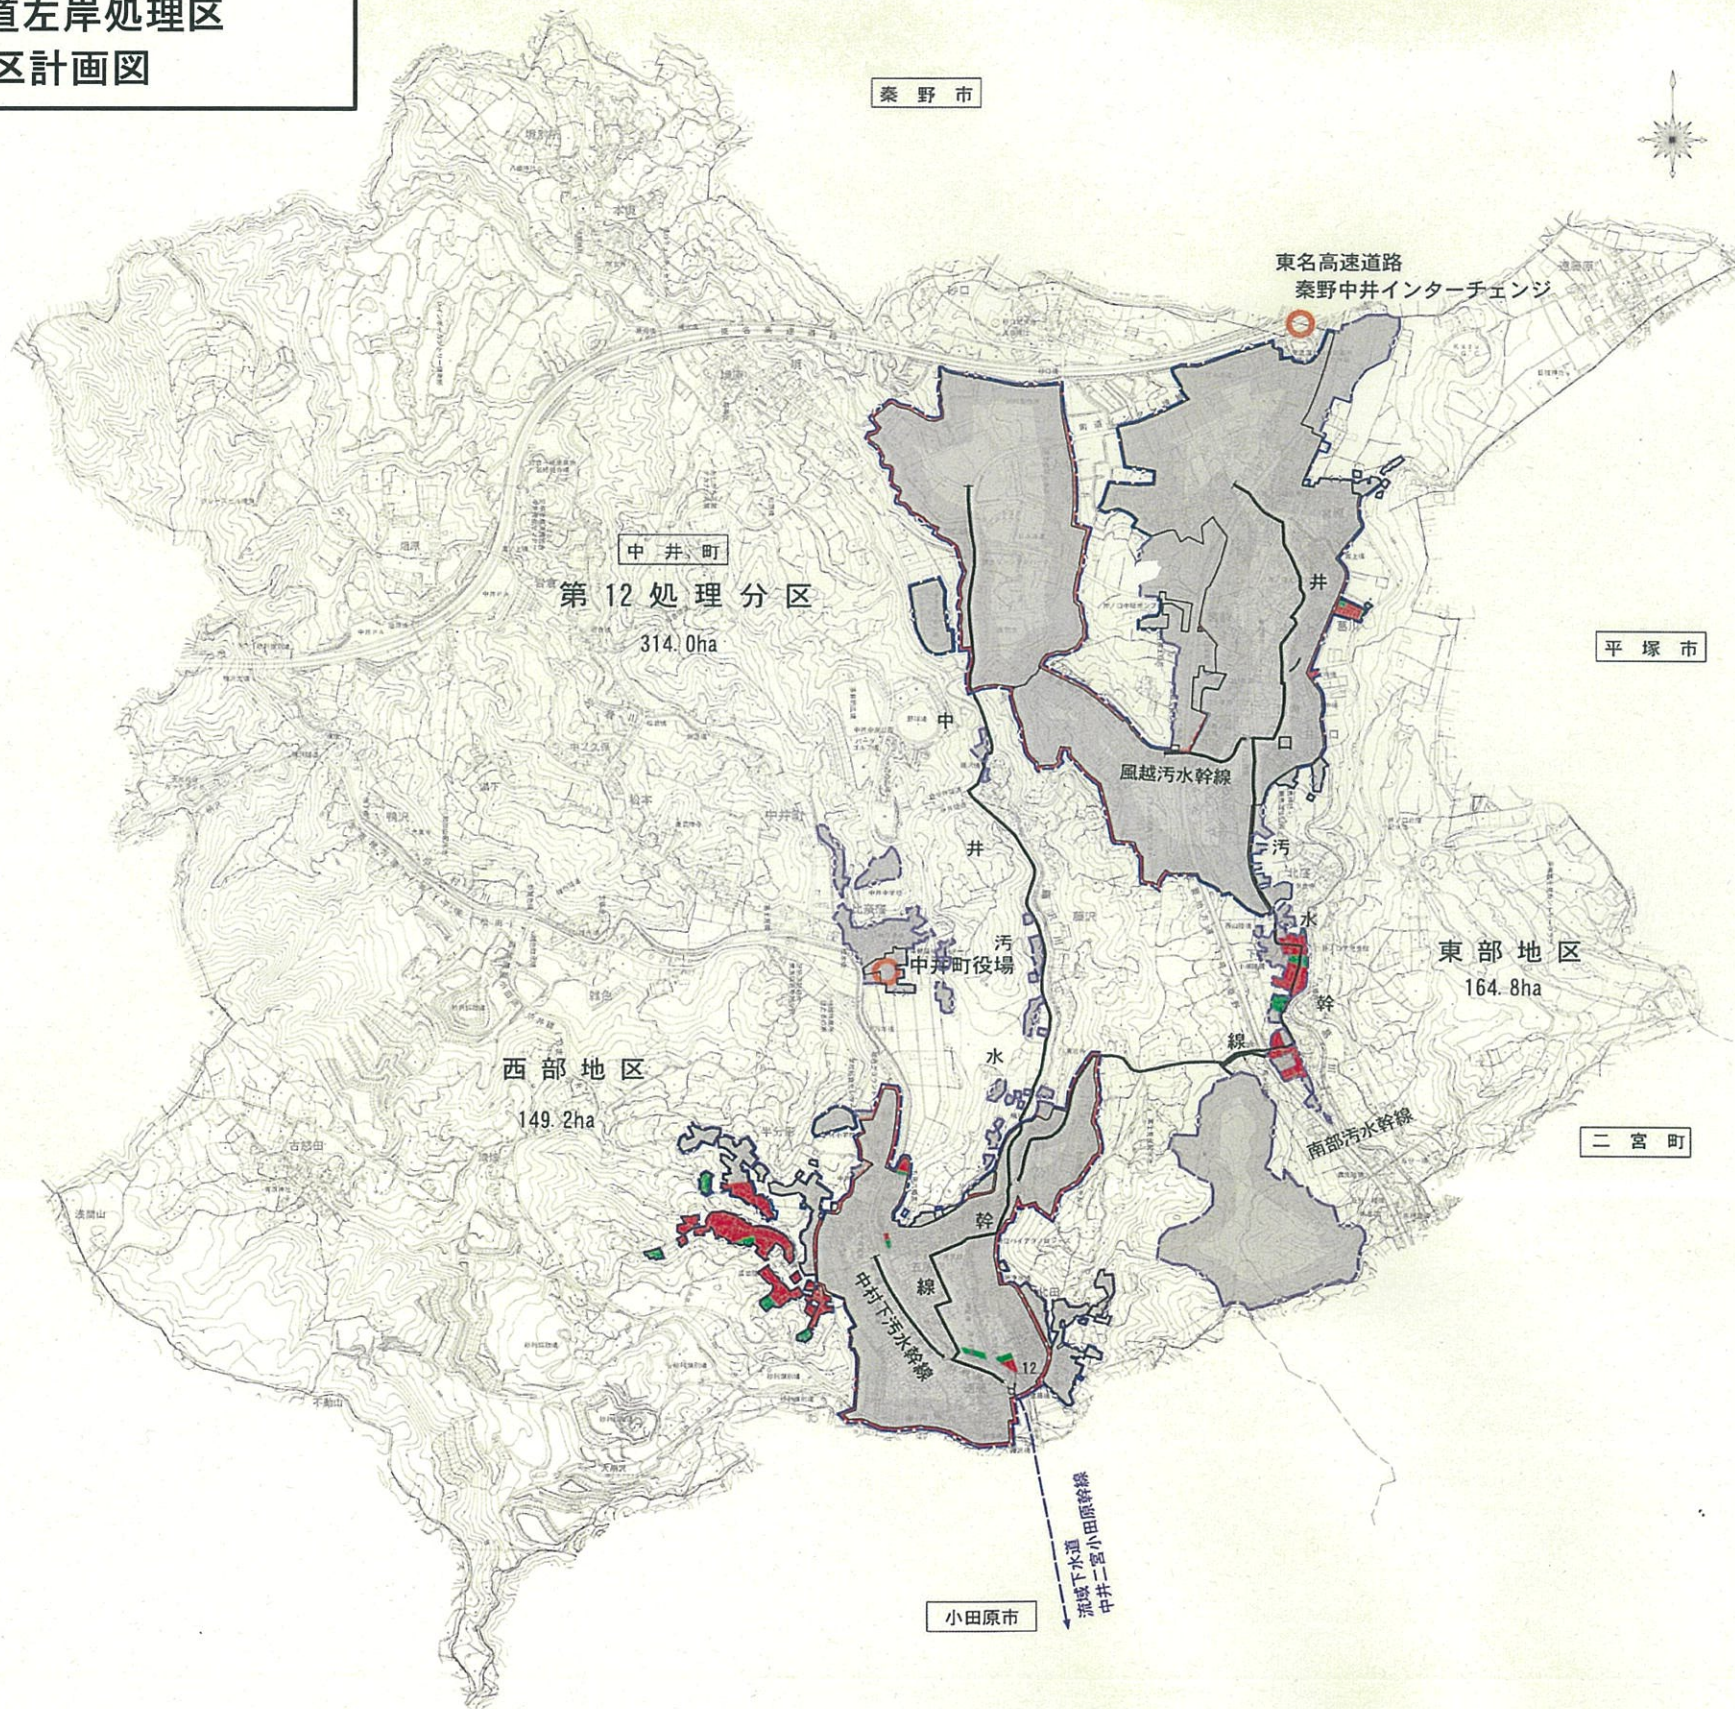

凡 例	
	行政区域界
	下水道計画区域
	地区界
	市街化区域
	流域下水道幹線
	流域下水道幹線との接続箇所番号
	事業計画区域
	計画幹線
	基幹事業 A1-1-1
	効果促進事業 C-1-1
